

Vorgangsnummer	Vorgang	Vorgangsdauer (in halben Arbeitstagen)	Nummern der unmittelbar vorangehenden Vorgänge	Frühester Beginn nach Start der unmittelbar vorangehenden Vorgänge	Spätester Beginn nach Start der unmittelbar vorangehenden Vorgänge
0	Projektbeginn	0			
1	Estrich aufbringen	1	0	0	0
2	Elektroinstallation	3	1	3	
3	Klempnerarbeiten	2	1	3	5
4	Malerarbeiten	3	0,2,3	4,3,2	7,-,-
5	Fußbodenbelag	1	4	3	3
6	Einbau der Küche	4	0,5	8,1	
7	Projektende	0	6	4	

Tab. 2.5.5

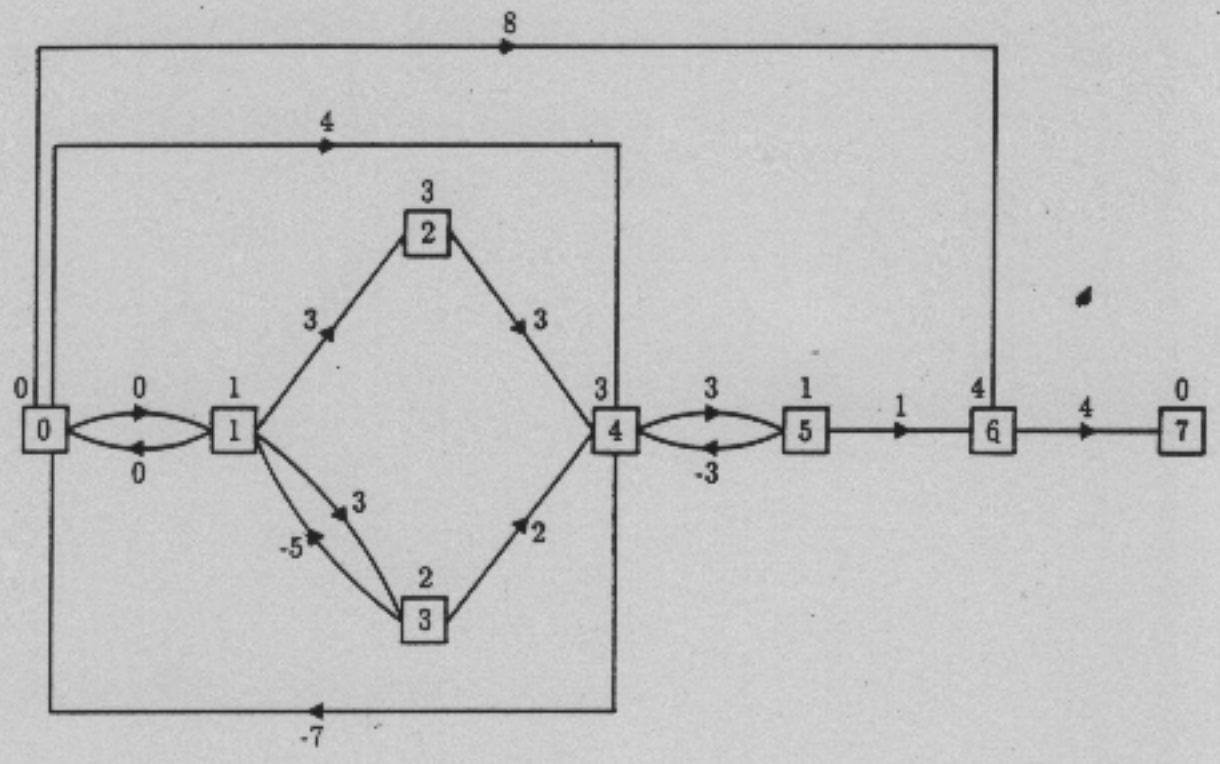


Abb. 2.5.19
